# Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W (36121) Kosów Lacki – Węgrów na odcinku od km 8+519 do km 17+322,13 dł. odcinka 8,8 km na terenie gminy Miedzna i na odcinku od km 19+225 do km 21+000 dł. 1,775 na terenie gminy Liw.

**Zarząd Powiatu Węgrowskiego informuje, że w 2010 roku zakończyła się realizacja zadania p.n.:**

,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W (36121) Kosów Lacki – Węgrów na odcinku od km 8+519 do km 17+322,13 dł. odcinka 8,8 km na terenie gminy Miedzna i na odcinku od km 19+225 do km 21+000 dł. 1,775 na terenie gminy Liw.”

Wydział Inwestycji i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Węgrowie
tel.(25) 792 60 66

**Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W (36121) Kosów Lacki – Węgrów na odcinku od km 8+519 do km 17+322,13 dł. odcinka 8,8 km na terenie gminy Miedzna i na odcinku od km 19+225 do km 21+000 dł. 1,775 na terenie gminy Liw.**

Głównym celem realizacji projektu p.n.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W (36121) Kosów Lacki – Węgrów na odcinku od km 8+519 do km 17 + 322, 13 dł. 8,8 km na terenie gminy Miedzna i na odcinku od km 19 + 225 do km 21 + 000 dł. 1,775 na terenie gminy Liw" jest:

- poprawa parametrów technicznych i standardów jakościowych regionalnej sieci drogowej,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

# Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W (36121) Kosów Lacki – Węgrów na odcinku od km 8+519 do km 17+322,13 dł. odcinka 8,8 km na terenie gminy Miedzna i na odcinku od km 19+225 do km 21+000 dł. 1,775 na terenie gminy Liw.

**Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:**

- – wycinka drzew – 37 szt.,
- – roboty ziemne /wykopy/ – 7143 m3,
- – roboty ziemne /nasypy/ – 273 m3,
- – przepusty o średnicy 60 cm – 20 mb,
- – podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniach gr. 30 cm – 3449 m2,
- – podbudowa z kruszywa łamanego na zjazdach – 909 m2
- – wykonanie wzmocnienia nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – 576m2
- – wykonanie poboczy żwirowych – 10934 m2,
- – nawierzchnia z kruszywa łamanego na zjazdach – 2081 m2,
- – podbudowa betonowa na zatokach autobusowych – 228 m2,
- – warstwa wiążąca z masy mineralno bitumicznej – 22753 m2,
- – warstwa ścieralna z nawierzchni mb – 61363 m2,
- – przepusty z rur betonowych na zjazdach – 344 mb,
- – oznakowanie poziome nawierzchni – 234 m2,
- – oznakowanie pionowe – 105 szt.,
- – wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej – 2795 m2,
- – wykonanie kanału deszczowego – 971 mb,
- – podbudowa z chudego betonu – 716 m2

Wydział Inwestycji i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Węgrowie
tel.(25) 792 60 66

**Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W (36121) Kosów Lacki – Węgrów na odcinku od km 8+519 do km 17+322,13 dł. odcinka 8,8 km na terenie gminy Miedzna i na odcinku od km 19+225 do km 21+000 dł. 1,775 na terenie gminy Liw.**

Koszty kwalifikowane:
5 799 836,46 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa- 2 899 918,00 zł
- środki udostępnione przez Beneficjenta, z tego:
- środki własne 1 449 959,23 zł
  - środki partnera Gminy Liw- 179 978,41 zł
  - środki partnera Gminy Miedzna- 1 269 980,82 zł

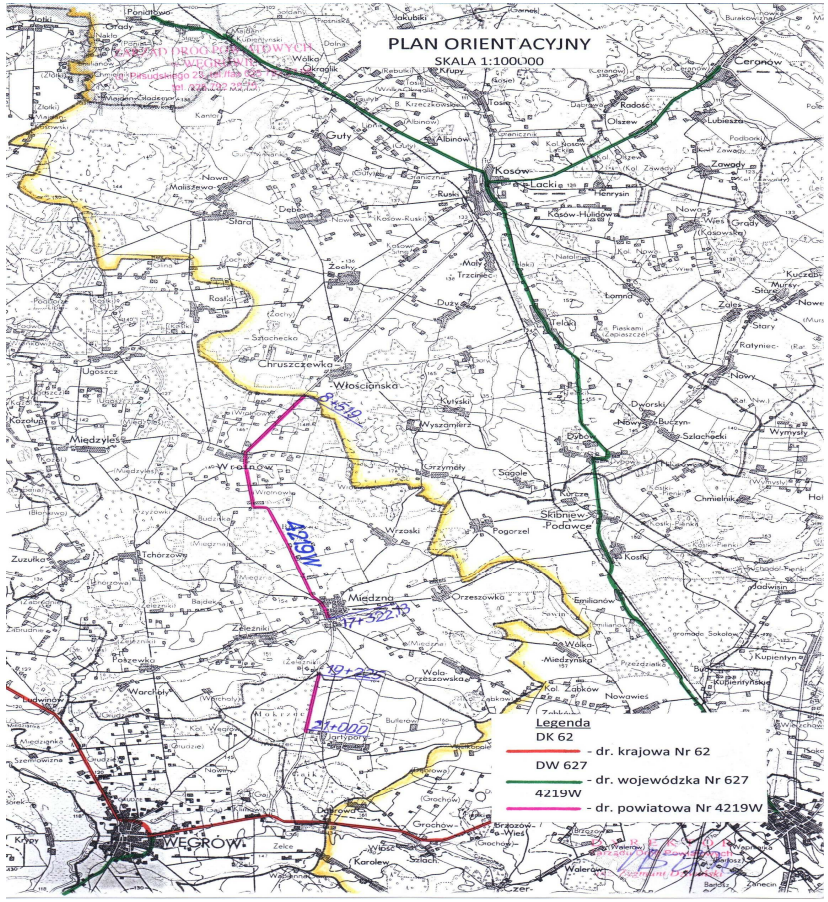


Wydział Inwestycji i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Węgrowie
tel.(25) 792 60 66

# Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W (36121) Kosów Lacki – Węgrów na odcinku od km 8+519 do km 17+322,13 dł. odcinka 8,8 km na terenie gminy Miedzna i na odcinku od km 19+225 do km 21+000 dł. 1,775 na terenie gminy Liw.

Inwestor:

Powiat Węgrowski

ul. Przemysłowa 5

07 – 100 Węgrów

www.powiatwegrowski.pl

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MIKST"

ul. Gdańska 69A

07 – 100 Węgrów
